



Opération d'effacement (2020)

Bassin : Dives

ROE113617_01



Seuil de stabilisation Rumesnil (ROE113617)




Yannick SALAVILLE



02 31 44 63 00



@ fd14.salaville@orange.fr

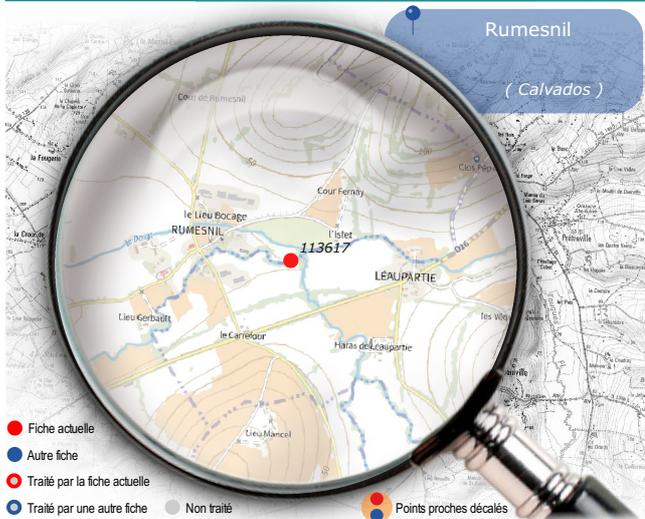

● Fiche actuelle

● Autre fiche

● Traité par la fiche actuelle

● Traité par une autre fiche

● Non traité

● Points proches décalés

La Dorette (largeur 5 - 10m)

Classement art. L214-17 code de l'environnement : Liste 1 Liste 2

ANG, LPR, TRM, TRF

Seuil de stabilisation Rumesnil

Type : Seuil en rivière

Dispositif(s) de franchissement piscicole : Absence de passe

Grenelle

Plan de gestion anguille

Dénivelé avant aménagement : 0.55 m



Longueur : 6 m

Accessibilité : Moyenne

Environnement : Prairies

Maîtrise d'ouvrage	Maîtrise d'œuvre	Études / Conception	Travaux
Fédération départementale des associations agréées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques du Calvados 02 31 44 63 00 www.federation-peche14.fr	FDAAPPMA14 02 31 44 63 00	FDAAPPMA14 02 31 44 63 00	LAFOSSE ET FILS 02 31 39 13 04

Descriptif des opérations	Caractéristiques	Résultats
<input checked="" type="checkbox"/> Effacement de l'ouvrage Juill. 2020 > Juill. 2020 ⏱ 1 jour Amélioration de l'état écologique, Mise en conformité réglementaire	Effacement de l'ouvrage, retalutage des berges et mise en place d'un géotextile coco.	Chute supprimée 0.55 m Linéaire restauré nr Linéaire reconnecté 30 m

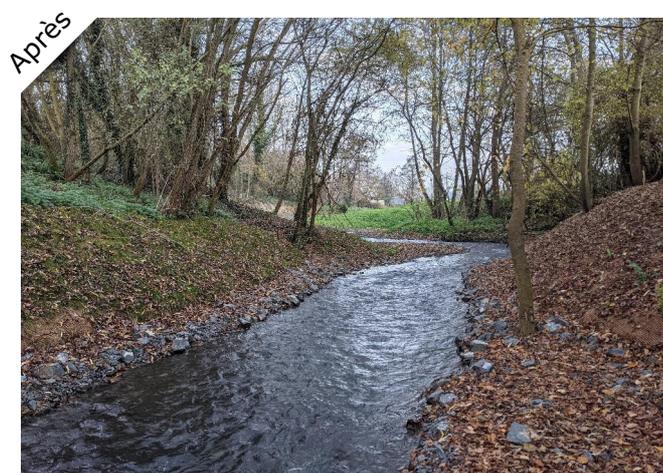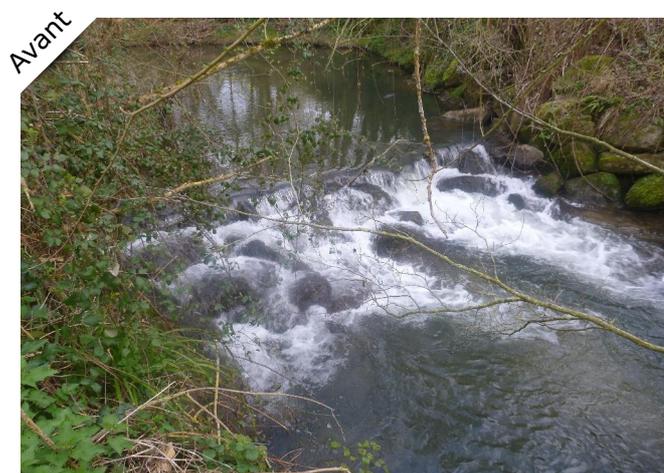

© (FDAAPPMA14) - 2016

© (FDAAPPMA14) - 2020

Suivi	Coûts de l'opération (€HT)	Part MO	Accompagnement financier *			
<input checked="" type="checkbox"/> Biologie	Études	0 €				
<input type="checkbox"/> Morphologie	Maîtrise d'œuvre	0 €				
<input type="checkbox"/> Physico-chimie	Travaux continuité	2 750 €	0 %	100 %	100%	
<input type="checkbox"/> Autres	Travaux connexes	0 €				
	Autres	0 €				
	2 750 €					



* Taux d'interventions valables à la date des demandes et susceptibles de varier.
